Cod.	Attività	Durata sett.
	Sostituzione giunti di dilatazione	**21**
A	**Installazione Cantiere (compresi i baraccamenti e gli eventuali impianti ove presenti)**	**1**
B	**Sostituzione Giunti di dilatazione tipo tampone viscoelastico del viadotto "Chiuse Brio, Km 13+850"**	**3**
B.01	Installazione Cantiere e Smobilizzo a fine giornata	3
B.02	Sostituzione Giunti di dilatazione	3
C	**Sostituzione Giunti di dilatazione tipo tampone viscoelastico del viadotto "Fontana D'oralice, Km 14+150"**	**3**
C.01	Installazione Cantiere e Smobilizzo a fine giornata	3
C.02	Sostituzione Giunti di dilatazione	3
D	**Sostituzione Giunti di dilatazione tipo tampone viscoelastico del viadotto "Fosso Peschiera, Km 14+380"**	**3**
D.01	Installazione Cantiere e Smobilizzo a fine giornata	3
D.02	Sostituzione Giunti di dilatazione	3
E	**Sostituzione Giunti di dilatazione tipo gomma armata del viadotto "Fosso Cantalupo, Km 14+690"**	**1**
E.01	Installazione Cantiere e Smobilizzo a fine giornata	1
E.02	Sostituzione Giunti di dilatazione	1
F	**Sostituzione Giunti di dilatazione tipo gomma armata del viadotto "Fosso Piano Martino, Km 15+200"**	**3**
F.01	Installazione Cantiere e Smobilizzo a fine giornata	3
F.02	Sostituzione Giunti di dilatazione	3
G	**Sostituzione Giunti di dilatazione tipo gomma armata del viadotto "Fosso Arnescia, Km 15+590"**	**3**
G.01	Installazione Cantiere e Smobilizzo a fine giornata	3
G.02	Sostituzione Giunti di dilatazione	3
H	**Sostituzione Giunti di dilatazione tipo gomma armata del viadotto "Fosso Comaese 1, Km 15+750"**	**3**
H.01	Installazione Cantiere e Smobilizzo a fine giornata	3
H.02	Sostituzione Giunti di dilatazione	3
I	**Smobilizzo del cantiere e pulizia delle aree**	**1**
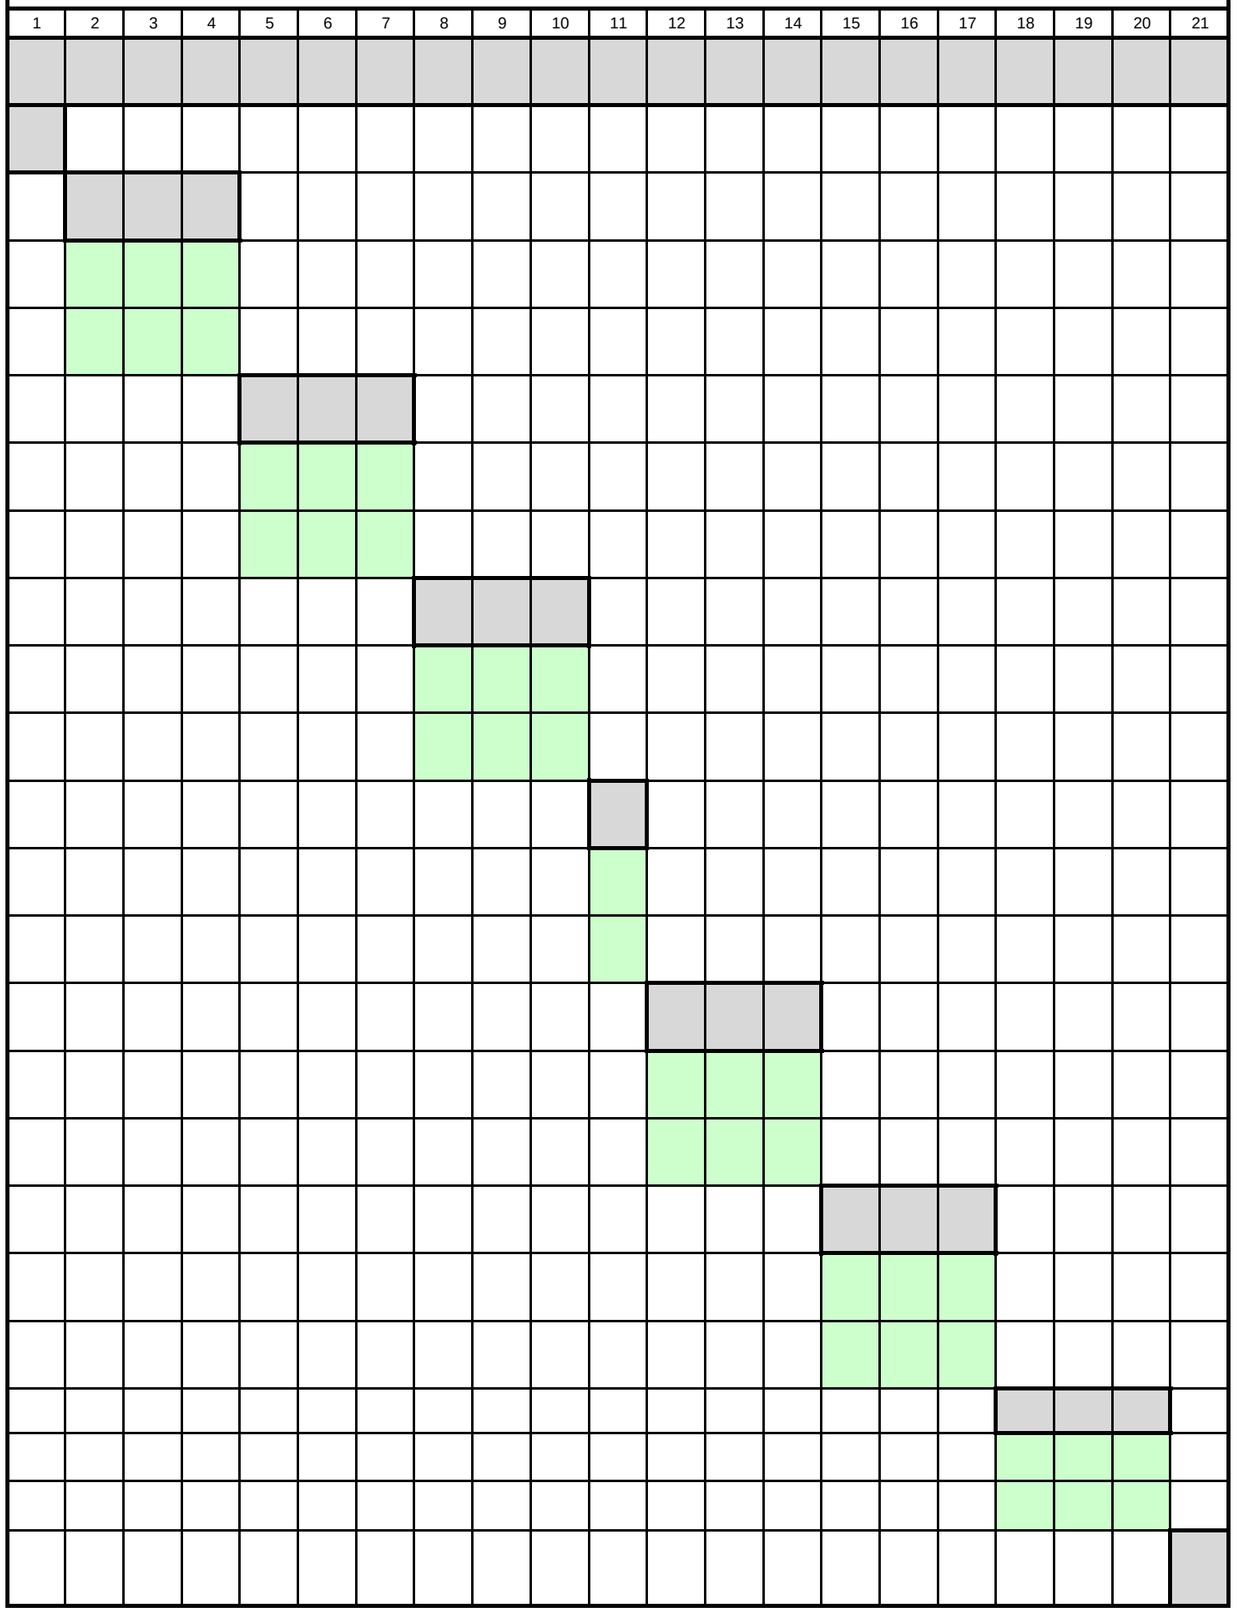
CRONOPRAGRAMMA DEI LAVORI
